
Ресурсная карта проекта

RE:FORM LIFE / Мария и Вика

Закрытый пилот настольного приложения

12.10–25.12.2026
Плановая версия 14 октября 2026

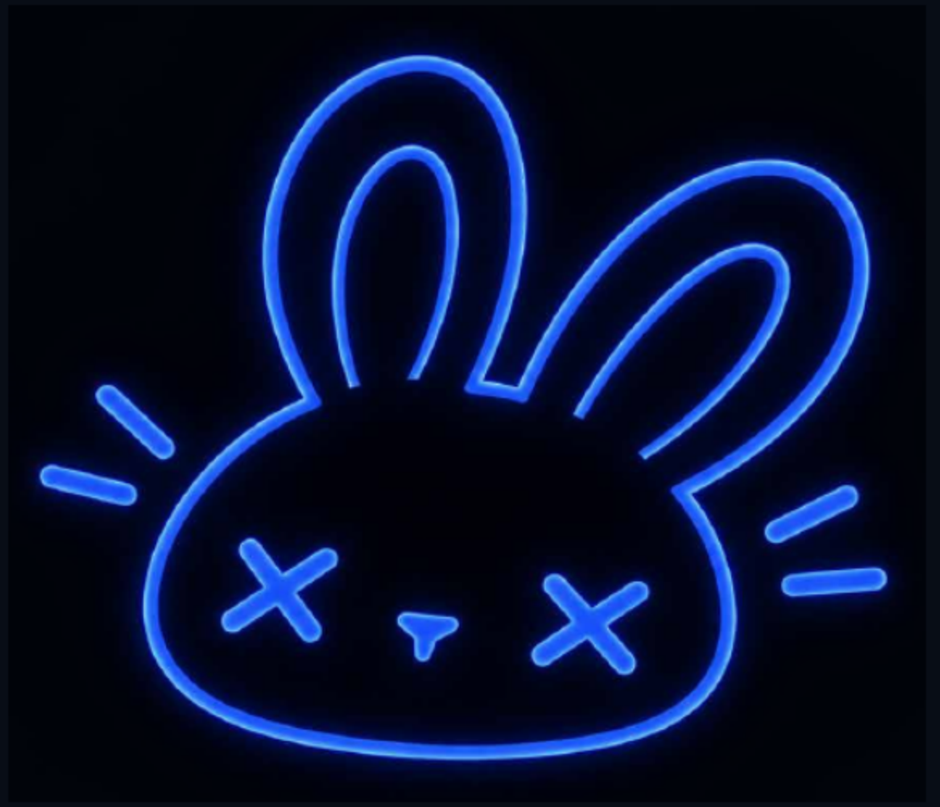

Паспорт ресурсной карты

Цель: обеспечить стабилизацию прототипа и пилот на 30 участниках

Поле единого шаблона	Что фиксируем
Код и тип	H — люди, T — техника, S — ПО, I — информация, F — деньги, D — время
Наименование и количество	Конкретный ресурс, число единиц, объём часов или документов
Связь с ИСР	Пакеты работ, которые используют ресурс. Всего 18 пакетов
Стоимость	Дополнительные расходы в рублях. Труд учитываем отдельно в часах
Основание и контроль	Источник, допущение, ответственный и срок проверки доступности

Команда подтверждена. Роли, занятость, техника и лимит расходов — плановые допущения. Вехи и критерии приёмки относятся к стабилизации существующего кода.

H1–H2: команда проекта

Два участника совмещают роли. Ответственность остаётся у команды

Ресурс	Количество и доступность	Задачи и связь с ИСР
H1 · Мария	1 человек, 216 ч доступности 110 ч пакетов работ	Управление, данные, код, сборки и исправления. Особенно 2.2, 3.1–3.4, 5.2
H2 · Вика	1 человек, 216 ч доступности 124 ч пакетов работ	Исследование, UX, набор, QA и анализ. Особенно 1.2, 2.1, 4.1–4.4, 5.1, 5.3

Плановая занятость: до 20 ч в полную неделю на человека, в среднем 4 ч в рабочий день. Распределение ролей требует согласования с участниками.

Выплаты в учебном проекте не предусмотрены. Это не означает нулевую рыночную стоимость труда. ИИ помогает с кодом и отладкой, но не считается отдельным сотрудником.

H3–H4: пользователи для исследования

Выборки помогают проверить потребность и удобство. Они не доказывают размер рынка

Ресурс	Количество и назначение	ИСР / контроль
H3 · Исследование	12 интервью и 5 UX-сессий	1.2, 2.1. Вика набирает респондентов до 15.10 и UX-группу до 29.10
H4 · Пилотная когорта	30 участников и 5 запасных 14 календарных дней наблюдения	4.2–4.4. Подтверждение участия до 27.11, активация 30.11
Условия участия	Добровольно, без вознаграждений Совместимый Windows-компьютер	Вика проверяет устройство и согласие при наборе

Группы могут пересекаться, поэтому 12 + 5 + 30 не равны 47 уникальным людям. Запасные и поздние участники учитываются отдельно от D7-когорты.

T1–T4: техника и инфраструктура

Новые покупки не заложены при наличии собственной и заёмной техники

Ресурс / количество	Назначение / ИСР	Стоимость и проверка
T1 · 2 рабочих ПК + 1 заёмный Windows	Разработка и QA на 3 конфигурациях 2.1–3.4, 4.1, 5.2, 5.3	0 ₽ новых покупок. Мария подтверждает наличие до проектирования и до 26.11
T2 · 1 внешний накопитель ≥16 ГБ	2 копии: локальная и внешняя 2.2, 3.4, 4.4, 5.3, 5.5	0 ₽ при наличии. Ёмкость и целостность проверяем в 2.2
T3 · 1 микрофон, 2 интернет-подключения	Голос, обмен файлами, поддержка 3.3, 4.1, 4.3–4.4	0 ₽ дополнительных затрат. Голос опционален
T4 · 30 Windows-ПК участников	Установка и ежедневные сценарии 4.3, 4.4	0 ₽ покупок за счёт проекта. Вика проверяет совместимость

Наличие техники — допущение. Минимальные системные требования и фактический размер копии фиксируем после аудита 2.2. Если носителя нет, проверяем цену перед покупкой.

S1–S5: программные ресурсы

Базовые сценарии работают локально, платный сервер и облачный ИИ не обязательны

Ресурс / количество	Использование / ИСР	Расходы и условия
S1 · 2 среды разработки, 1 база на установку	Python, Flask, pywebview, SQLite 2.2, 3.1–3.4, 5.2	0 ₽ новых лицензий базового стека. Версии в requirements.txt
S2 · 2 редактора кода, 1 Git-репозиторий	Версии, баги и резерв кода 1.3, 2.2–5.5	VS Code и Git, без платных расширений
S3 · 1 комплект макетов и 1 реестр KPI	UX, исследование, аналитика 1.2–2.1, 4.4, 5.1, 5.5	Имеющийся редактор или LibreOffice, без подписки
S4 · 1 локальная модель Vosk	Тест опционального голоса 3.3, 4.1	Размер и лицензию конкретной модели проверяем в 2.2
S5 · 0 обязательных облачных ключей	Разговор EVE — опциональное расширение 3.3, 4.1	0 ₽ в базовом плане. Регион, тариф и оплату проверяем отдельно

SQLite — public domain. Перед распространением проверяем лицензии библиотек и моделей. Бесплатность инструмента не подтверждает доступность облачного сервиса в регионе.

I1–I3: информационные ресурсы

Материалы исследования, приёмки и сдачи имеют измеримый объём

Ресурс	Количество	Связь с ИСР / владелец
I1 · Исследование и обратная связь	12 протоколов интервью 5 UX-чек-листов, ≥20 анкет	1.2, 2.1, 4.4, 5.1 Вика собирает, обе анализируют
I2 · Требования и тестовые данные	18 пакетов, 10 сценариев 20 проверок, 3 набора данных	1.3, 2.2, 4.1, 5.3 Мария: данные, Вика: QA
I3 · Согласия и комплект сдачи	30 согласий, 1 журнал событий 1 комплект документов	4.2–4.4, 5.5 Вика: согласия, обе: итоговый пакет

События: идентификатор, тип действия, дата и версия сборки. Для анализа не нужны тексты личных задач и суммы расходов. Данные собираем с согласия, иначе используем дневник и сверку QA.

F1: финансовые ресурсы

Лимит расходов отделён от часов труда и стоимости владения техникой

Статья	План	Основание
Новые устройства и платные подписки	0 ₽ в базовом сценарии	Используем имеющуюся технику и бесплатные базовые инструменты
Оплата труда и вознаграждения	0 ₽ выплат, 234 ч работ	Учебный проект и добровольное участие. Рыночная оценка труда не выполнена
F1 · Операционный резерв	Лимит 3 000 ₽	Носитель, дополнительная связь или непредвиденные траты. ИСР 2.2, 4.2–4.4, 5.5

3 000 ₽ — предложенный лимит, а не подтверждённая смета или цена услуги. Перед покупкой Мария проверяет актуальную цену, фиксирует расход и остаток. Если лимита недостаточно, команда пересматривает бюджет.

D1–D2: время и резерв

54 рабочих дня, 11 недель, 04.11 исключён. Часы по дням распределяются гибко

Ресурс времени	Расчёт	Назначение
D1 · Валовая доступность	54 × 4 ч × 2 = 432 ч	По 216 ч на участника, до 20 ч в полную неделю
Пакеты ИСР	110 + 124 = 234 ч	Плановые оценки стабилизации существующего прототипа
D2 · Сопровождение	20% × 432 = 86,4 ч	Коммуникация, поддержка и подготовка материалов
D2 · Нераспределённый резерв	432 − 234 − 86,4 = 111,6 ч	Ошибки оценок, исправления, повторная приёмка. Включает буфер 24.12

Резерв — около 26% доступности. Контрольные точки имеют нулевую длительность и не добавляют часов. Пилот длится 14 календарных дней, поддержка — в рабочие дни.

Загрузка Марии и Вики

Проверяем доступность по неделям, а не только по общей сумме часов

Период	Мария, ч работ	Вика, ч работ	Доступно на человека
H1–H3	19,0	35,0	60 ч
H4	12,0	12,0	16 ч
H5–H7	48,0	40,0	60 ч
H8–H9	11,0	19,0	40 ч
H10	9,0	9,0	20 ч
H11	11,0	9,0	20 ч

Максимум часов пакетов за неделю: Мария 18 ч, Вика 19 ч. В неделю 02.11 доступно по 16 ч. Сопровождение размещаем в свободных часах. Если занятость ниже, пересчитываем календарь или объём.

Ресурсы ИСР: исследование и ядро

H1, H2, D1 и D2 относятся ко всем пакетам. Остальные ресурсы указаны по кодам

Код и пакет	Период	Мария / Вика, ч	Ресурсы
1.1 Паспорт проекта	12.10–14.10	3 / 3	S3, I3
1.2 Спрос и альтернативы	15.10–23.10	4 / 20	H3, S3, I1
1.3 ИСР и требования	26.10–28.10	6 / 6	S2, S3, I2
2.1 Прототип и UX	29.10–06.11	2 / 16	H3, T1, S3, I1
2.2 Данные и восстановление	29.10–06.11	16 / 2	T1, T2, S1, S2, I2, F1
3.1 Задачи и привычки	09.11–20.11	22 / 2	T1, S1, S2, I2

Каждый код раскрыт на ресурсных слайдах: наименование, количество, назначение и стоимость. Пакет 5.4 — буфер одного дня, часы исправлений берём из резерва.

Ресурсы ИСР: сборка и набор

H1, H2, D1 и D2 относятся ко всем пакетам. Остальные ресурсы указаны по кодам

Код и пакет	Период	Мария / Вика, ч	Ресурсы
3.2 Ручной учёт	09.11–13.11	6 / 6	T1, S1, S2, I2
3.3 Команды EVE	16.11–20.11	6 / 6	T1, T3, S1, S2, S4, S5, I2
3.4 Интеграция и сборка	23.11–25.11	10 / 2	T1, T2, S1, S2, I3
4.1 Приёмка пилота	26.11–27.11	2 / 10	T1, T3, S1, S4, I2
4.2 Набор участников	16.11–27.11	2 / 14	H4, S3, I3, F1
4.3 Установка и активация	30.11–30.11	3 / 3	H4, T3, T4, I3

Каждый код раскрыт на ресурсных слайдах: наименование, количество, назначение и стоимость. Пакет 5.4 — буфер одного дня, часы исправлений берём из резерва.

Ресурсы ИСР: пилот и завершение

H1, H2, D1 и D2 относятся ко всем пакетам. Остальные ресурсы указаны по кодам

Код и пакет	Период	Мария / Вика, ч	Ресурсы
4.4 Пилот и наблюдение	30.11–13.12	8 / 16	H4, T2, T3, T4, S3, I1, I3, F1
5.1 Анализ результатов	14.12–16.12	2 / 8	S3, I1
5.2 Исправления пилота	17.12–22.12	14 / 2	T1, S1, S2, I2
5.3 Повторная проверка	23.12–23.12	1 / 5	T1, T2, S1, I2
5.4 Резерв завершения	24.12–24.12	0 / 0	I3
5.5 Решение и документы	25.12–25.12	3 / 3	T2, S2, S3, I3, F1

Каждый код раскрыт на ресурсных слайдах: наименование, количество, назначение и стоимость. Пакет 5.4 — буфер одного дня, часы исправлений берём из резерва.

Рынок и достоверность расчётов

Официальные страницы проверены 14.10.2026, цены платных услуг не использованы

Проверенный факт	Вывод для ресурсной карты
Todoist Beginner: бесплатно, 5 личных проектов	Есть бесплатная альтернатива для задач. Платная подписка в план не включена
TickTick Free: $0, 9 списков, 99 задач на список	Бесплатные планеры повышают требования к удобству нового продукта
Notion Free: €0 за пользователя/месяц	Платный сервис для организации пилота не обязателен
SQLite: public domain. VS Code: официальная лицензия	Локальные базовые инструменты не требуют новых лицензионных платежей
Gemini API: доступ зависит от региона и условий	Облачный разговор опционален. Тариф и доступ проверяем перед включением

В интервью сравниваем привычные альтернативы. Наличие функций не подтверждает спрос. Покупки, региональная доступность и конкретные лицензии требуют проверки перед использованием.

Контроль доступности и рисков

Проверка ресурса привязана к сроку и ответственному

Риск или дефицит	Контроль	Действие
Недостаток времени команды	Мария и Вика сверяют остаток часов еженедельно	Убрать необязательные улучшения, пересмотреть объём или срок
Нет техники или носителя	Мария проверяет до 2.2, заёмный ПК — до 26.11	Проверить цену, использовать резерв, повторить восстановление
Недобор пользователей	Вика проверяет список 20.11, итог — 27.11	5 запасных кандидатов, ограничения выборки в отчёте
Потеря данных или сбой	3/3 восстановления, 0 открытых P0/P1	Остановить пилот при P0, Мария исправляет, Вика проверяет
Облачный сервис недоступен	Проверка региона, ключа и оплаты до включения	Локальные команды и ручной ввод остаются базовыми

Новые функции не используют резерв 24.12. Безопасность данных и обязательную QA-проверку сохраняем при пересмотре объёма.

Обратная связь и комплект сдачи

Каждый участник прикрепляет согласованную PDF-презентацию самостоятельно

Замечания преподавателя	Текст замечаний не предоставлен. Конкретные правки не считаем выполненными до получения обратной связи.
Реестр замечаний	Точная формулировка, код ИСР, изменение ресурса, ответственный, дата и проверка результата.
Обновление плана	Если меняются количество, доступность или стоимость, одновременно обновляем карту, ИСР, календарь и KPI.
Проверка перед сдачей	У всех ресурсов есть имя, количество и связь с ИСР. Допущения видимы, источники указаны, суммы часов согласованы.

Источники и допущения

Основания ресурсной карты и границы достоверности

Материалы проекта

Исходная презентация, план работ и проектный план.

PRODUCT.md и requirements.txt подтверждают статус прототипа и технический стек.

Команда: Мария и Вика. Роли, 20 ч в неделю, наличие оборудования и лимит 3 000 ₽ — допущения для согласования.

Официальные источники

todoist.com/pricing
ticktick.com/about/upgrade
notion.com/pricing
sqlite.org/copyright.html
code.visualstudio.com/license
ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions

Дата проверки источников: 14.10.2026. Рабочая нагрузка: 234 ч. Валовая доступность: 432 ч. Денежные значения отражают дополнительные расходы учебного проекта.
