
RE:FORM LIFE

Планирование жизни и формирование привычек

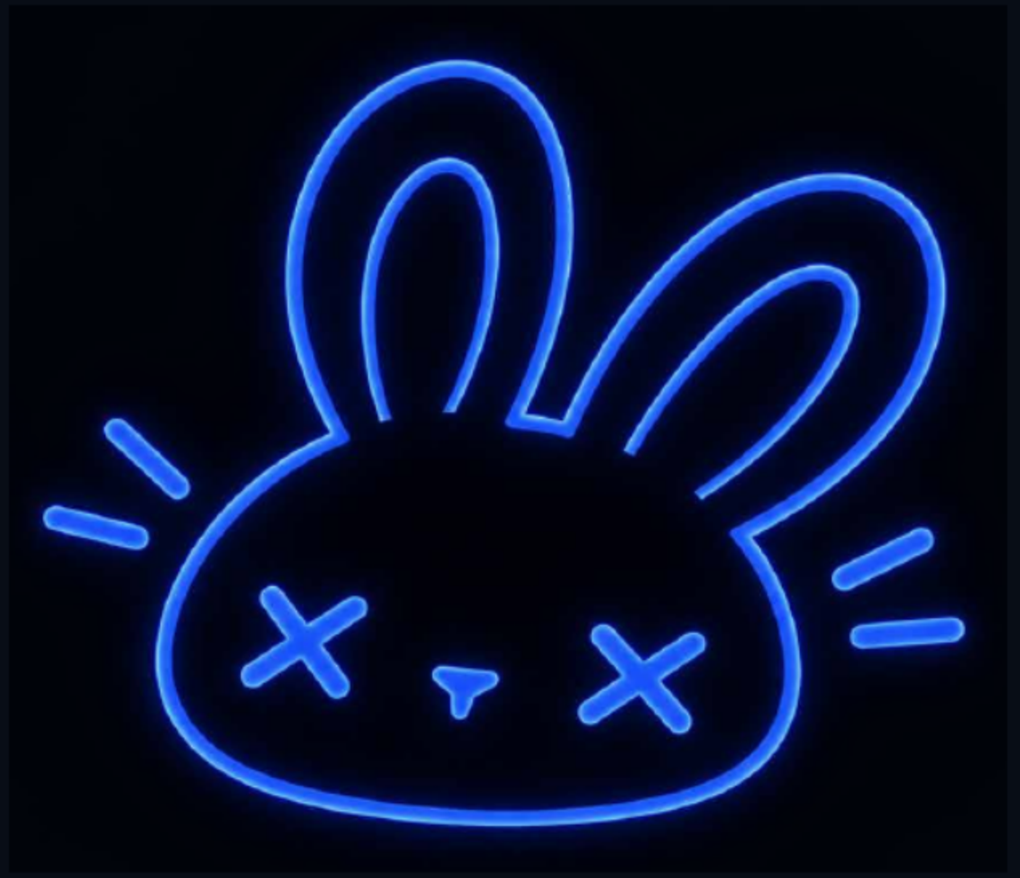

Учебный проект

Мария и Вика

12 октября — 25 декабря 2026

Идея проекта

Единое настольное приложение для личных планов и повседневных записей

Проблема	Задачи, привычки и бытовые записи хранятся в разных инструментах. Пользователю сложно видеть общий план.
Решение	Обзор недели и месяца, отметки привычек, ручной учёт финансов и коммунальных платежей в одном интерфейсе.
Роль EVE	Ассистент выполняет поддерживаемые команды. Свободный разговор и голос зависят от настроек и сервисов.
Гипотеза пользы	Объединение сценариев упростит ежедневное планирование. Это проверяем в пилоте, эффект пока не доказан.

Аудитория и рыночные альтернативы

Первый сегмент: русскоязычные пользователи Windows, совмещающие учёбу, работу и домашние дела

Решение	Проверенная бесплатная версия	Что проверяем в интервью
Todoist	Beginner: 5 личных проектов	Достаточно ли задач и напоминаний
TickTick	Free: 9 списков, 99 задач на список	Удобство планирования и привычек
Notion	Free: €0 за пользователя/месяц	Готовность настраивать свою систему
Календарь + таблица	Имеющиеся инструменты пользователя	Время на перенос записей между ними
RE:FORM LIFE	Пилот без платы за использование	Нужен ли единый локальный интерфейс

Официальные страницы проверены 14.10.2026. Бесплатные альтернативы повышают требования к удобству. Оплата и доступность в регионе требуют отдельной проверки.

Методология: Agile с Kanban

Короткие итерации подходят для проверки UX и функций EVE

Почему Agile	Требования уточняются после интервью и пользовательских сессий. Результат каждой итерации можно проверить.
Как работает Kanban	Доска: «Запланировано», «В работе», «Проверка», «Готово». Не более одной основной задачи в работе на человека.
Ритм команды	Раз в неделю: проверка прогресса, затрат и приоритетов. Перед вехой: демонстрация и приёмка по KPI.
Критерий готовности	Результат сохранён, проверка пройдена, Вика проверила сценарий, Мария включила исправления в сборку.

Основные характеристики проекта

Стабилизация существующего прототипа и закрытый пилот, 18 пакетов работ

Параметр	План проекта
Команда	Мария: управление и код. Вика: UX, исследование и QA. Роли совмещаются.
Срок	12.10–25.12.2026, 11 недель, 54 рабочих дня, 04.11 исключён
Результат	Проверенная Windows-сборка, пилот на 30 участниках, отчёт и решение о развитии
Объём	Неделя/месяц, привычки, ручной учёт, 10 команд EVE, резервные копии
За пределами пилота	Мобильное приложение, синхронизация, банковские интеграции, платный запуск
Ресурсы	432 ч доступности двух участников, денежный лимит 3 000 ₽

Средняя занятость 4 ч в рабочий день на человека и наличие техники — плановые допущения. Даты сохраняются при стабилизации готового кода, а не разработке с нуля.

SMART-цель проекта

К 25.12.2026 принять стабильную сборку и оценить пользу на закрытом пилоте

SMART	Содержание цели
S · Конкретная	Подготовить пилот RE:FORM LIFE с планерами, привычками, ручным учётом и командами EVE
M · Измеримая	10/10 сценариев, 0 P0/P1, ≥24/30 активированных, D7 ≥40%, полезность ≥4/5 при ≥20 анкетах
A · Достижимая	Используем существующий прототип. 2 участника, 234 ч пакетов, 432 ч доступности
R · Значимая	Проверяем, помогает ли единый интерфейс регулярно планировать и отмечать повседневные дела
T · Во времени	Активация 30.11, пилот до 13.12, итоговая приёмка 23.12, закрытие 25.12

Продуктовые пороги — проверяемая гипотеза. Проект может завершиться обоснованным решением доработать или остановить её.

Треугольник проекта

Срок, стоимость и содержание связаны. Качество задаёт критерий приёмки

Время	Закрытие 25 декабря. Резерв расписания — 24 декабря. Пилот длится 14 календарных дней.
Стоимость	Без новых платных подписок. Лимит денежных расходов 3 000 ₽. Труд учитываем отдельно в часах.
Содержание	18 пакетов ИСР. Ядро: планирование, привычки и данные. Расширения EVE и оформления сокращаем первыми.
Качество	0 P0/P1, 10/10 обязательных сценариев, 3/3 восстановления. При росте работ пересматриваем объём или срок.

Метод приоритизации: MoSCoW

Приоритет показывает необходимость результата для текущего пилота

Категория	Правило	Применение в RE:FORM LIFE
M · Must have	Без результата пилот не состоится	Данные и копии, задачи, привычки, QA, набор и отчёт
S · Should have	Высокая польза, есть временный обход	Стабилизация ручного учёта, ограниченные команды EVE
C · Could have	Улучшение после обязательных работ	Мудборд, анимация маскота, косметическая полировка
W · Won’t have now	Вне текущего периода	Облако и расширенный ИИ, мобильная версия, банковские интеграции

Порядок выбора: обязательность для пилота, зависимость других задач, риск, затем удобство. Пересмотр еженедельно. S входят в текущий базовый план, их удаление требует изменить сценарии и KPI.

Как приоритеты меняют план работ

Подзадачи исходной ИСР встроены в единый календарный план

Исходная задача	Код новой ИСР	Приоритет и обоснование
Макеты недели, месяца и привычек	2.1	M: проверка основных пользовательских сценариев
Мудборд и палитра	2.1	C: используем текущий стиль, без редизайна перед пилотом
База задач и привычек	2.2	M: хранение и восстановление данных обязательны
Связь с языковой моделью	3.3, расширение	W: облачный разговор не нужен для базовой приёмки
Логика команд EVE	3.3	S: 10 проверяемых команд, ручной ввод как обход
Пользовательский тест и исправления	2.1, 4.4, 5.2	M: без проверки пользы нет основания для развития

MoSCoW относится к объёму работ. P0–P3 обозначают серьёзность ошибок и применяются отдельно.

Иерархическая структура работ

Уровень 0: пилот RE:FORM LIFE. Уровень 1: пять этапов. Уровень 2: 18 пакетов

Этап	Пакеты работ	Выход этапа
1 · Исследование	1.1 Паспорт, 1.2 Спрос, 1.3 Требования	Цель и базовый план
2 · Проектирование	2.1 UX, 2.2 Данные и восстановление	Проверенные макеты и схема данных
3 · Стабилизация	3.1 Задачи, 3.2 Учёт, 3.3 EVE, 3.4 Сборка	Кандидат для пилота
4 · Пилот	4.1 QA, 4.2 Набор, 4.3 Активация, 4.4 Наблюдение	Данные о качестве и использовании
5 · Завершение	5.1 Анализ, 5.2 Правки, 5.3 QA, 5.4 Резерв, 5.5 Итог	Принятая сборка и решение

ИСР: исследование и ядро

M — обязательно, S — важно. Часы: Мария / Вика. Все KPI являются плановыми

Код и пакет	Даты	Приор. / часы	Зависит от	KPI приёмки
1.1 Паспорт проекта	12.10–14.10	M / 3 + 3	—	Цель, границы и роли согласованы
1.2 Спрос и альтернативы	15.10–23.10	M / 4 + 20	1.1	12 интервью, 5 альтернатив, ≥8 подтверждений
1.3 ИСР и требования	26.10–28.10	M / 6 + 6	1.2	18 пакетов, 10 сценариев приёмки
2.1 Прототип и UX	29.10–06.11	M / 2 + 16	1.3	5 сессий, ≥4/5 без подсказок
2.2 Данные и восстановление	29.10–06.11	M / 16 + 2	1.3	Схема данных, 3/3 восстановления
3.1 Задачи и привычки	09.11–20.11	M / 22 + 2	2.1, 2.2	Сценарии 01–05 и 09 проходят

ИСР: сборка и подготовка пилота

M — обязательно, S — важно. Часы: Мария / Вика. Все KPI являются плановыми

Код и пакет	Даты	Приор. / часы	Зависит от	KPI приёмки
3.2 Ручной учёт	09.11–13.11	S / 6 + 6	2.1, 2.2	Расчёты и сохранение верны, 0 потерь
3.3 Команды EVE	16.11–20.11	S / 6 + 6	3.2	10 команд совпадают с ручным действием
3.4 Интеграция и сборка	23.11–25.11	M / 10 + 2	3.1, 3.3	1 сборка и инструкция запуска
4.1 Приёмка пилота	26.11–27.11	M / 2 + 10	3.4	20/20 проверок, 10/10 сценариев, 0 P0/P1
4.2 Набор участников	16.11–27.11	M / 2 + 14	2.1	30 участников и 5 запасных
4.3 Установка и активация	30.11–30.11	M / 3 + 3	4.1, 4.2	≥24 активированных из 30

ИСР: наблюдение и завершение

M — обязательно, S — важно. Часы: Мария / Вика. Все KPI являются плановыми

Код и пакет	Даты	Приор. / часы	Зависит от	KPI приёмки
4.4 Пилот и наблюдение	30.11–13.12	M / 8 + 16	4.3*	14 дней, D7 ≥40%, ≥20 анкет, ≥4/5
5.1 Анализ результатов	14.12–16.12	M / 2 + 8	4.4	100% KPI рассчитаны, 3 улучшения
5.2 Исправления пилота	17.12–22.12	M / 14 + 2	5.1	Все P0/P1 закрыты
5.3 Повторная проверка	23.12–23.12	M / 1 + 5	5.2	10/10 сценариев, 3/3 восстановления
5.4 Резерв завершения	24.12–24.12	M / 0 + 0	5.3	1 рабочий день буфера, без новых функций
5.5 Решение и документы	25.12–25.12	M / 3 + 3	5.4	100% документов, 1 решение о развитии

* 4.4 начинается 30.11 после утренней активации. 5.4 — календарный буфер, часы исправлений берём из резерва.

Вехи: готовность к пилоту

Контрольная точка имеет нулевую длительность. Подтверждение: протокол, сборка или реестр событий

КТ / дата	Результат	KPI	ИСР / ответственный
КТ1 / 23.10	Спрос исследован	12 интервью, ≥8/12 подтверждений	1.2 / Вика
КТ2 / 28.10	Базовый план принят	18 пакетов, 100% с ролями и KPI	1.3 / Мария
КТ3 / 06.11	Проектирование завершено	UX ≥4/5, восстановление 3/3	2.1, 2.2 / Обе
КТ4 / 27.11	Допуск к пилоту	20/20, 10/10, 0 P0/P1, 30 участников	4.1, 4.2 / Вика
КТ5 / 30.11	Когорта активирована	≥24/30, активация ≥80%	4.3 / Обе

Вехи: результаты и завершение

Контрольная точка имеет нулевую длительность. Подтверждение: протокол, сборка или реестр событий

КТ / дата	Результат	KPI	ИСР / ответственный
КТ6 / 13.12	Пилот завершён	D7 ≥40%, ≥20 анкет, полезность ≥4/5	4.4 / Вика
КТ7 / 16.12	Выводы согласованы	100% KPI, сроки и владельцы P0/P1	5.1 / Обе
КТ8 / 23.12	Финальная приёмка	10/10, 0 P0/P1, восстановление 3/3	5.3 / Вика
КТ9 / 25.12	Проект закрыт	Сборка, отчёт, ИСР, Гант, ресурсная карта	5.5 / Обе

При невыполнении критерия фиксируем причину и решение. Пилот блокируют ошибки P0/P1. Низкие продуктовые метрики ведут к доработке гипотезы.

KPI сроков, бюджета и качества

Для каждой метрики есть формула, владелец и источник

Тип KPI	Плановый порог	Учёт и ответственность
Сроки	КТ9 — 25.12, 9/9 вех в базовые даты	Вехи в срок / 9, календарь, Мария, еженедельно
Бюджет	Фактические расходы ≤3 000 ₽	Сумма подтверждённых расходов, реестр, Мария
Качество	10/10 сценариев, 20/20 проверок, 0 P0/P1	Протокол QA и журнал ошибок, Вика
Производительность	≥80% запланированных пакетов недели приняты	Принятые / запланированные пакеты, доска Kanban, обе
Риски	0 потерь данных, 3/3 восстановления	Журнал инцидентов, тестовые копии, Мария + Вика

Порог производительности и денежный лимит добавлены как плановые предложения. Объём недели согласуем до её начала.


KPI пользы: активация и D7

Когорта активируется 30 ноября, D7 измеряем 7 декабря 2026

Активация ≥80%	Завершили установку, создали и выполнили задачу, отметили привычку / 30 приглашённых. Нужно ≥24 человека.
D7 ≥40%	Активированные 30.11, выполнившие задачу или отметку привычки 07.12 / все активированные 30.11. При n=24 нужно ≥10.
Полезность ≥4/5	Сумма оценок / число валидных анкет. Не менее 20 ответов 11–13 декабря, один ответ от участника.
Источник данных	Обезличенные события с согласия или дневник со сверкой QA. Время Europe/Moscow. Отсутствие события не считаем успехом.

Диаграмма Ганта: подготовка и сборка

12.10–25.12.2026. Полоса — календарный интервал, не непрерывная занятость

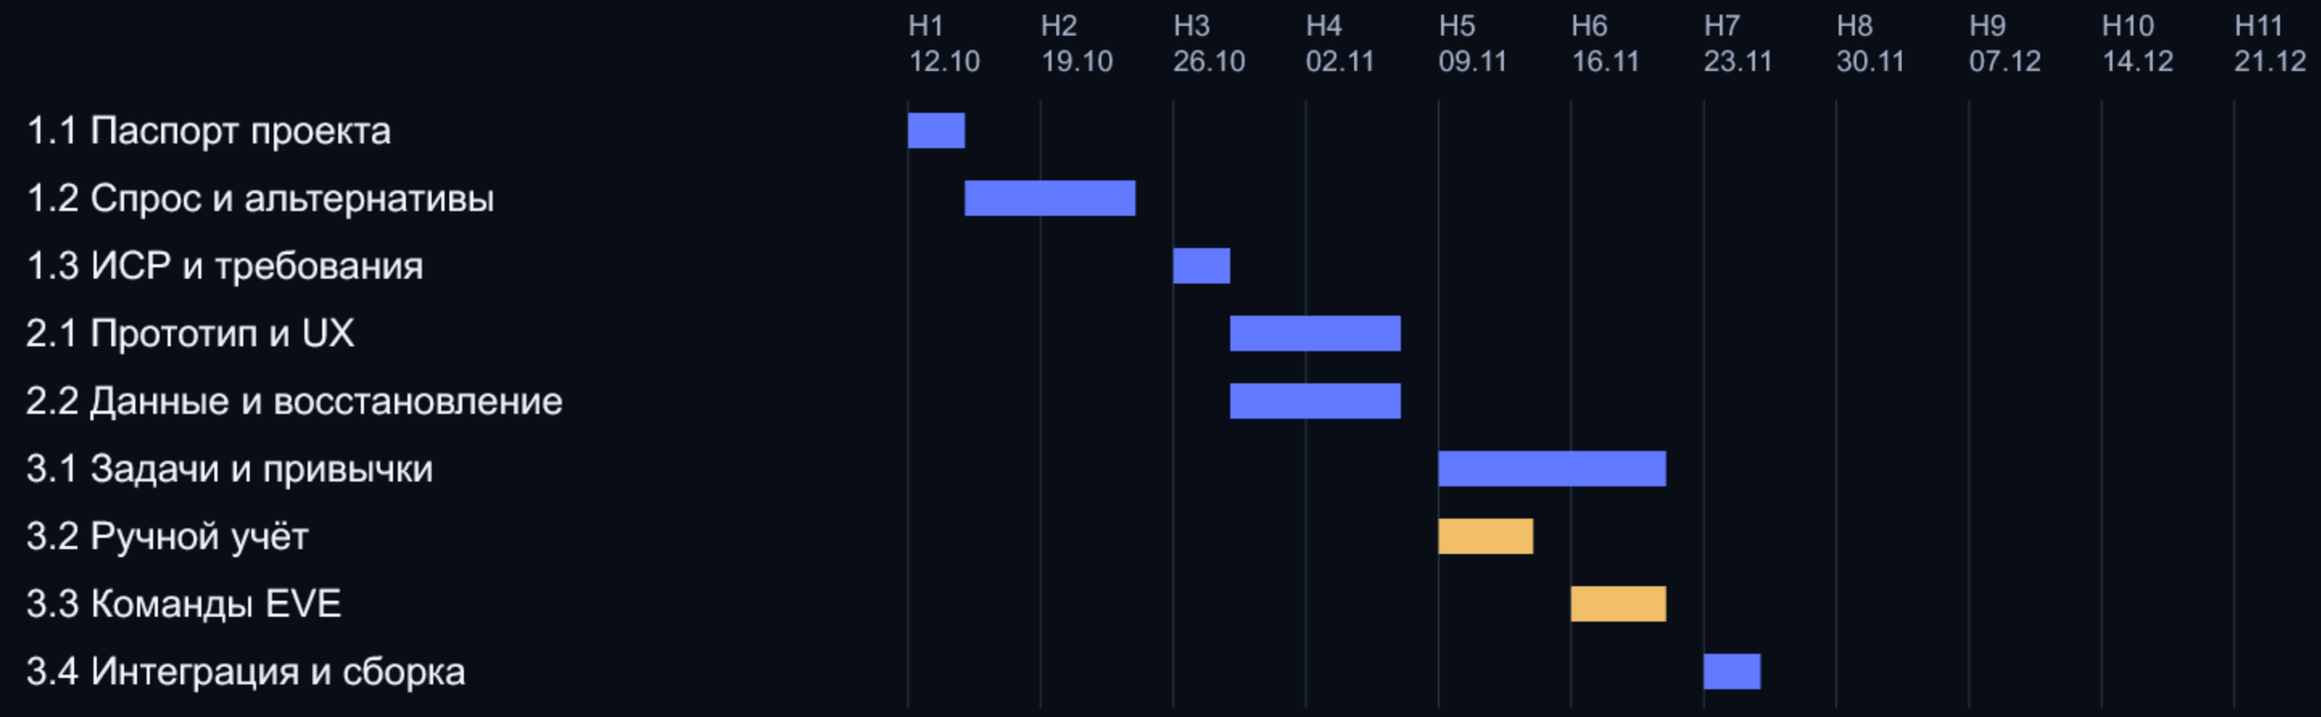

Синий: M. Золотой: S. 04.11 — нерабочий день. Поддержка пилота — по рабочим дням.

КТ1 23.10 КТ2 28.10 КТ3 06.11 КТ4 27.11

Диаграмма Ганта: пилот и завершение

12.10–25.12.2026. Полоса — календарный интервал, не непрерывная занятость



Синий: M. Золотой: S. 04.11 — нерабочий день. Поддержка пилота — по рабочим дням.

КТ5 30.11 КТ6 13.12 КТ7 16.12 КТ8 23.12 КТ9 25.12

Ресурсная карта: команда и время

Два участника совмещают роли. Доступность — допущение для согласования

Ресурс	Количество и объём	Связь с ИСР
Мария	1 человек, 110 ч пакетов из 216 ч	Управление, данные, код, сборки и исправления
Вика	1 человек, 124 ч пакетов из 216 ч	Интервью, UX, набор, QA и анализ
Пользователи	12 интервью, 5 UX-сессий	1.2, 2.1, группы могут пересекаться
Пилотная когорта	30 участников + 5 запасных	4.2–4.4, добровольное участие
Календарь	54 дня × 4 ч × 2 = 432 ч	1.1–5.5, 04.11 исключён
Баланс часов	234 ч работы + 86,4 ч сопровождения + 111.6 ч резерва	Всего 432 ч, резерв 24.12 внутри этого объёма

ИИ помогает с кодом и отладкой, но не считается отдельным сотрудником. Мария и Вика принимают решения и проверяют результат.

Ресурсная карта: техника и ПО

Базовый пилот работает локально, новых платных сервисов не требует

Ресурс / количество	ИСР	Условие доступности
2 компьютера команды + 1 заёмный Windows	2.1–3.4, 4.1, 5.3	Наличие подтвердить, проверка на 3 конфигурациях
1 внешний накопитель ≥16 ГБ	2.2, 4.4, 5.3, 5.5	2 копии базы, локальная и внешняя, без покупки при наличии
1 микрофон, 2 подключения к интернету	3.3, 4.1, 4.4	Голос опционален, ручной ввод доступен
2 среды Python + Flask + pywebview, SQLite	2.2, 3.1–3.4, 5.2	Локальная база, версии из requirements.txt
2 редактора кода, 1 Git-репозиторий	1.3–5.5	Бесплатный базовый набор без платных расширений
1 комплект макетов и таблиц, 1 модель Vosk	2.1, 3.3, 4.1, 5.1	Имеющийся редактор, лицензию модели проверить

Облачный разговор: 0 обязательных ключей и запросов. Доступ API, регион и стоимость проверяем до включения расширения.

Ресурсная карта: информация и деньги

Ресурсы привязаны к результатам ИСР, расходы отделены от трудозатрат

Ресурс	Количество	ИСР
Протоколы исследования	12 интервью + 5 UX-чек-листов	1.2, 2.1
Требования и приёмка	18 пакетов + 10 сценариев + 20 проверок	1.3, 4.1, 5.3
Тестовые данные	3 набора без личных данных	2.2, 4.1, 5.3
Согласия, события и анкеты	30 согласий, ≥20 анкет, 1 журнал событий	4.2–4.4, 5.1
Документы сдачи	1 комплект для каждого участника	5.5
Денежный резерв	Лимит 3 000 ₽, базовые закупки 0 ₽	2.2, 4.2–4.4, 5.5

3 000 ₽ — предложенный лимит, не подтверждённая смета. 0 ₽ предполагает имеющуюся технику и добровольное участие. Работа команды учтена в часах, а не как бесплатный рыночный труд.

Загрузка команды и контроль ресурсов

Часы пакетов распределены внутри календарных интервалов

Период	Мария, ч пакетов	Вика, ч пакетов	Доступность на человека
H1–H3	19.0	35.0	60 ч
H4	12.0	12.0	16 ч
H5–H7	48.0	40.0	60 ч
H8–H9	11.0	19.0	40 ч
H10	9.0	9.0	20 ч
H11	11.0	9.0	20 ч

Максимальная недельная загрузка пакетов: Мария 18.0 ч, Вика 19.0 ч. На неделе 02.11 доступно 16 ч на человека. Сопровождение размещаем в свободных часах.

Риски и действия команды

Контроль рисков встроен в вехи, ИСР и ресурсную карту

Риск	Сигнал	Действие и владелец
Слабый спрос	На КТ1 менее 8/12 подтверждений	Вика уточняет сегмент, Мария пересматривает объём
Недобор пилота	На 20.11 мало подтверждений	Вика ведёт резерв из 5 кандидатов, не смешивает D7-когорты
Потеря данных	Любая P0 или неуспешное восстановление	Остановить пилот, копия до обновления, Мария исправляет
Перегрузка двух участников	Загрузка выше согласованного лимита	Убрать C, пересмотреть S и критерии, затем срок
Недоступность облачного API	Нет легального доступа или оплаты	Локальные команды и ручной ввод остаются базой
Малая выборка	Мало анкет или слабое удержание	Указывать n и ограничения, не переносить результат на рынок

Приёмка и решение о развитии

Готовность сборки и продуктовая гипотеза проверяются отдельно

Техническая готовность	10/10 сценариев, 20/20 проверок перед пилотом, 0 открытых P0/P1, 3/3 чистых установок и восстановлений.
Развивать	Финальная приёмка пройдена, активация ≥80%, D7 ≥40%, полезность ≥4/5 при ≥20 анкетах.
Доработать	Сборка готова, но хотя бы один продуктовый порог не достигнут или недостаточно данных.
Остановить гипотезу	Спрос не подтвердился или остаётся риск потери данных. Итоговый отчёт фиксирует причины и следующий шаг.

Источники и плановые допущения

Ресурсная карта составлена по единому шаблону и передаётся отдельным PDF

Материалы проекта

Первая презентация, план работ, два одинаковых PDF проектного плана, PRODUCT.md и requirements.txt.

Команда: Мария и Вика в составе проекта. Занятость, распределение ролей, наличие техники и лимит 3 000 ₽ требуют согласования.

Проверка рынка 14.10.2026

todoist.com/pricing
ticktick.com/about/upgrade
notion.com/pricing
sqlite.org/copyright.html
code.visualstudio.com/license
ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions

Текст замечаний преподавателя не предоставлен. Для их учёта ведём реестр: замечание, код ИСР, изменение, проверка, дата. Каждый участник прикрепляет согласованный комплект самостоятельно.
